

Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2025

Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră, Lotul 1: "Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana **Pod Giurgiu**

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr proiect: 101079314 – 21-RO-TC- Giurgiu Bridge - CEF-T-2021-CORECOEN
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 120.066.572,91 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 102.056.586,97 EURO

Execuție și proiectare lucrări

Contract 125/04.12.2020

Valoare contract: 654.455,09 mii lei fără TVA, cf AA

Contractant: **PORR Construct SRL**.

Durata de implementare: 91 luni (6 luni proiectare + 24 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Ordin de începere: 04.01.2021

Stadiu: contract în derulare

Termen estimat de finalizare: 2024

Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Contract 151/08.11.2021

Valoare contract servicii: 7.594,32 mii lei fără TVA conform actelor adiționale

Consultant: Asocieria S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.

Durata de implementare: 91 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Stadiu: contract servicii în derulare.


❖ Stadiu în trimestrul I, 2025

Lucrări aferente Lot 1 finalizate, în garanție

❖ Stadiu în trimestrul IV 2024

Lucrări aferente Lot 1 finalizate.

În data de 30.05. 2024 a fost semnat și emis
PVRTL nr. 1D/1552/30.05.2024 pentru
lucrările aferente Lot 1

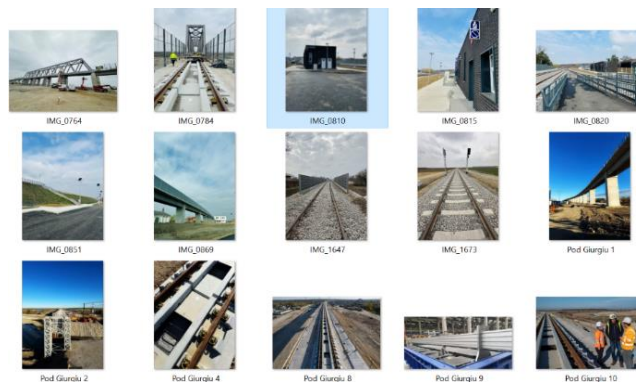

❖ Stadiu în trimestrul II 2024




Lucrări aferente Lot 1 finalizate. 07 iunie 2024 - organizarea evenimentului de finalizare
lucrări, cf Planului de Comunicare

În data de 30.05. 2024 a fost semnat și emis
PVRTL nr. 1D/1552/30.05.2024 pentru lucrările
aferente Lot 1

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **99.52%**

Stadiu financiar: **96.22%**

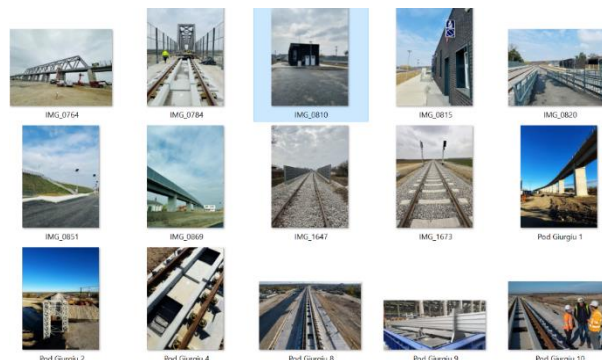

❖ Stadiu în trimestrul II 2024

Lucrări aferente Lot 1 finalizate. 07 iunie 2024 - organizarea evenimentului de finalizare

lucrări, cf Planului de Comunicare

În data de 30.05. 2024 a fost semnat și emis
PVRTL nr. 1D/1552/30.05.2024 pentru lucrările
aferente Lot 1

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **99.52%**

Stadiu financiar: **96.22%**

❖ **tadiu în trimestrul I 2024**

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **95.98%**

Stadiu financiar: **92.06%**

❖ **Stadiu în trimestrul IV 2023**

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **89.06%**


Stadiu financiar: **86.24%**

❖ **Stadiu în trimestrul III 2023**

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **78.34%**

Stadiu financiar: **81.21%**

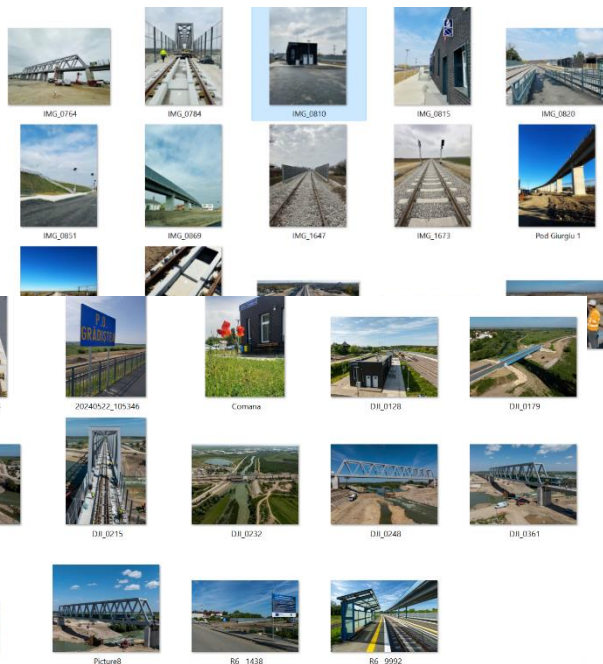


❖ Stadiu în trimestrul II 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: 70.61%

Stadiu financiar: 74.80%

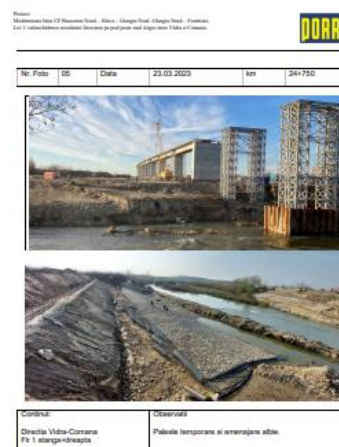


❖ Stadiu în trimestrul I 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: 61.50%

Stadiu financiar: 66.37%

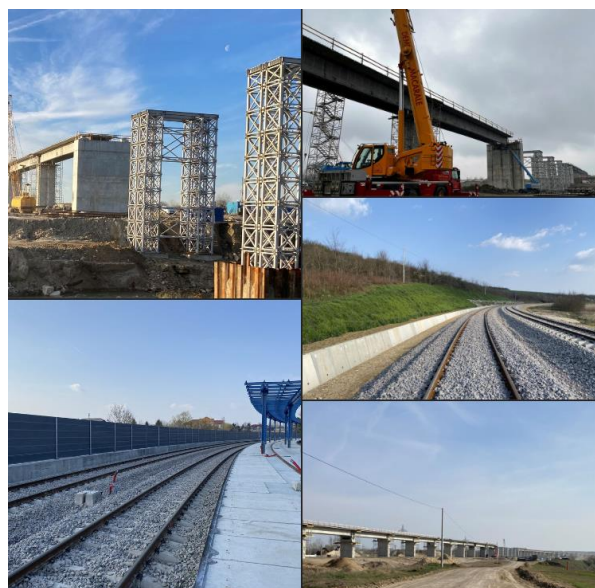



❖ **2021-2022**

În luna octombrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare din CEF

Contract de lucrări în execuție, ordinul de începere a fost dat în 04.01.2021

Stadiu fizic 100 % proiectare

Stadiu fizic 44.81% lucrări

Stadiu financiar: 71.63%
