

Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2025

**Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria,
componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația
cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov -
Sighișoara, subsecțiunile:**

1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara

Materiale de publicitate foto - video:

Youtube [aici](#)

FaceBook [aici](#)

LinkedIn [aici](#)

FINANȚARE PROIECT

Decizie de finanțare prin Program Transport 2021 - 2027

- ❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 488.492.809 euro, din care contribuția
FC (85%) - 415.218.888 euro
RO (15%) - 73.273.921 euro
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-31.12.2024,
- ❖ Ianuarie 2025 - prezent: proiect finanțat din titlul aferent Programului Transport 2021-2027

IMPLEMENTARE PROIECT

❖ EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI IMPLEMENTARE ERTMS

Contract semnat în 05.03.2020

Contractor: Asocieria Alstom Transport S.A. - Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) - Arcadia Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocieria RailWorks, lider al asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.

Valoarea contractului de lucrări: 3.439.580.881,05 lei fără TVA, modificare cf Act Adițional

Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 (pana la 31.12.2024) și PT în prezent

Durata de implementare: 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Ordin de începere: 16.04.2020

Stadiu: contract în derulare

❖ Stadiu, trimestrul IV 2025

Stadiu fizic lucrări: 54.07%

Stadiu financiar: 50.60%




❖ Stadiu, trimestrul III 2025


Stadiu fizic lucrări: 53.47%

Stadiu financiar: 48.03%

Subsecțiunea S1: Brașov - Apața

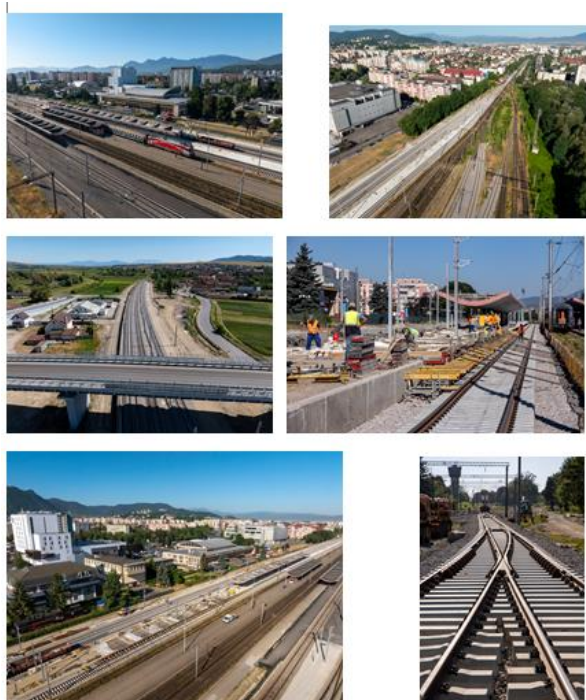

Subsecțiunea S3: Cața - Sighișoara

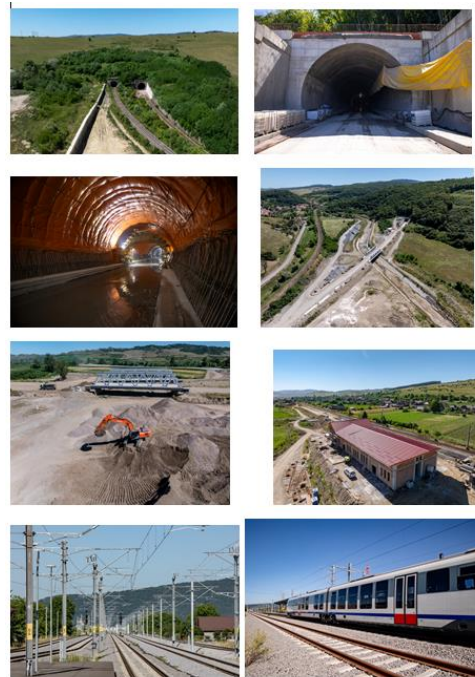

Stadiu, trimestrul II 2025


Stadiu fizic lucrări: 48.98%


Stadiu financiar: 40.69%

❖ Stadiu, trimestrul I 2025

Stadiu fizic lucrări: 43.98%

Stadiu financiar: 41.49%

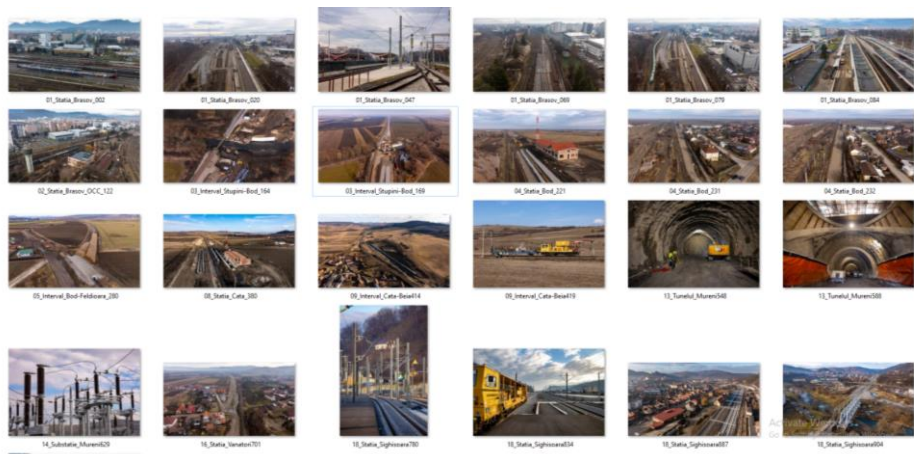


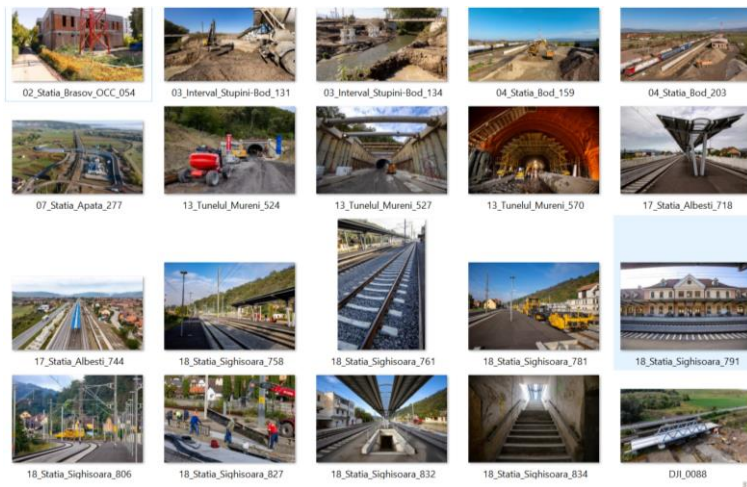

❖ Stadiu, trimestrul IV 2024

Stadiu fizic lucrări: 38.88%

Stadiu financiar: 31.71%

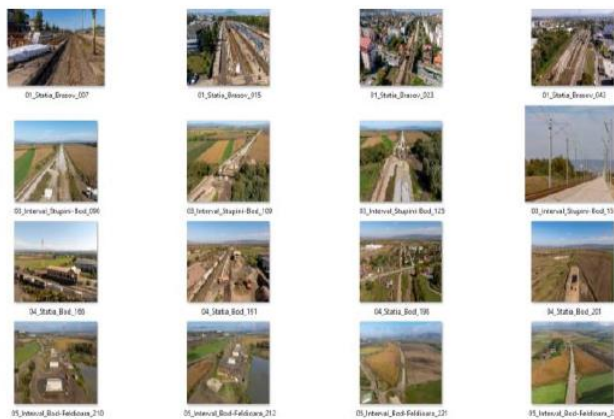

❖ Stadiu, trimestrul III 2024


Stadiu fizic lucrări: 31.71%

Stadiu financiar: 29.98%

❖ Stadiu, trimestrul II 2024

Stadiu fizic lucrări: 30.02%

Stadiu financiar: 28.74%

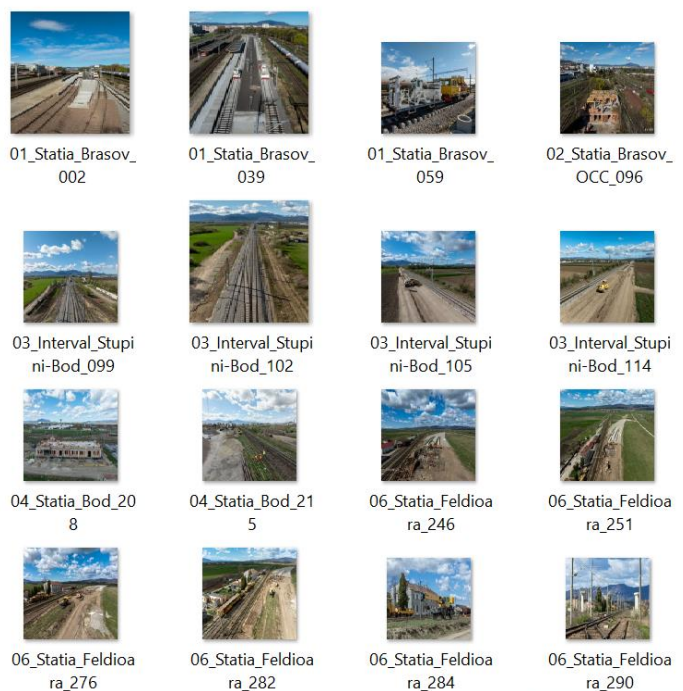

❖ Stadiu, trimestrul I 2024

Stadiu fizic lucrări: 25.80%


Stadiu financiar: 22.19%



❖ Stadiu, trimestrul IV 2023

Stadiu fizic lucrări: 24.15%

Stadiu financiar: 21.58%

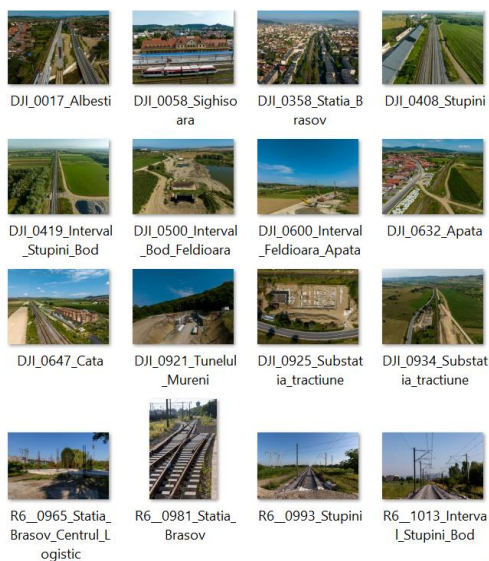

❖ Stadiu, trimestrul III 2023

Stadiu fizic lucrări: 22.86%

Stadiu financiar: 19.32%



❖ Stadiu, trimestrul II 2023


Stadiu fizic lucrări: 21.75%

Stadiu financiar: 18.22%



❖ **Stadiu, trimestrul I 2023**
Stadiu fizic lucrări: 19.53 %
Stadiu financiar: 15.72 %

❖ **Stadiu, trimestrul IV 2022**
Stadiu fizic lucrări: 19.28 %
Stadiu financiar: 13.65 %

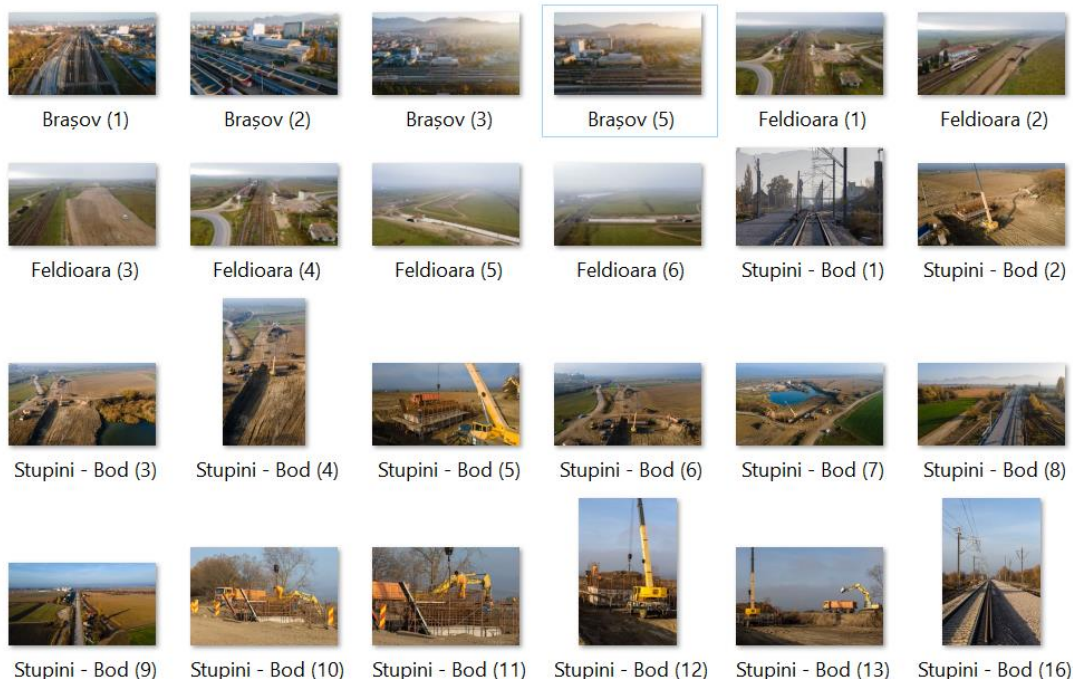

❖ Stadiu, trimestrul III 2022

Stadiu fizic lucrări: 16.01 %

Stadiu financiar: 13.65 %



202106_Săpătură în ampriză,
săpătură între piloți consolidare
și taluzare km 242+448 ÷
242+929



202106_Săpătură în ampriză,
săpătură între piloți consolidare



202106_Săpătură între coloane
forate consolidare km 242+448
÷ 242+929



202106_Săpătură pentru
platforma tehnologică coloane
forate viaduct km 251+774



Type: JPG File
Size: 85.7 KB
Date modified: 31/01/20
2021 platforma
km 252+525



202106_Tronson experimental –
Interval Brașov – Stupini



202106_Umpluturi compactate
în straturi în jurul fundației
podetului km 239+365



202107_Betonare și taluzare
consolidare cu piloți Beia km
247+295 ÷ 247+633



202107_Cofrare fundații aripi
prefabricate podet km 248+495



202107_Cofrare și armare
grinda de coronament –
consolidare Beia km 247+295 ÷
247+633

❖ Stadiu, trimestrul II 2022

Stadiu fizic lucrări: 13.60 %

Stadiu financiar: 13.14 %

Au fost efectuate lucrări la

S1 Brasov - Cata: st. Brasov (LC, PI , EG), interval Bv-Stupini (LC, PI), st Stupini (LC, PI),

S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR)



202102-Paloș 1 km – 242+700
Profilare taluz Fir II_2



202102-Podet km 262+477



202102-Podet km 271+233



202102-Terasamente km
271+000



202102-Terasamente km
271+200



202102-Viaduct km 254+400 –
Drum tehnologic



202102-Viaduct km 254+400 –
Drum tehnologic_2



202102-Viaduct km 254+400 –
Săpătură fără sprijiniri culee 1 și
pila 1



202103-Archita km 253+150 ÷
253+400 – Platforma
tehnologică și betonare piloți



202103-Așternere substratul căii
– Stația Brașov

❖ Stadiu, trimestrul I 2022

Stadiu fizic lucrări: 12 %

Stadiu financiar: 10 %

22.02.2022, a fost emisă factura aferentă CIP nr.10 pentru lucrările din perioada 26 noiembrie 2021 - 25 decembrie 2021

S-a lucrat în st. Brasov (LC, PI , EG), interval Bv-Stupini (LC, PI), st Stupini (LC, PI), statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR,).

17.03.2022, a fost emisă factura aferentă CIP nr.11 pentru lucrările efectuate în perioada 01 ianuarie 2022 - 25 ianuarie 2022

❖ 2021

Stadiu fizic lucrări: 11.6%

Stadiu financiar: 11.75%



S-a lucrat în stația Brașov (liniile 6, 7, 8), interval Brașov-Stupini fir II, pasaj Feldioara, interval Cața-Archita (terasamente, drumuri, consolidări - piloți), interval Stupini - Bod (scoatere din cale piatra spartă), interval Archita - Vanatori (podețe), stația Albești Târnava.

În stațiile de cale ferată de pe tronson au fost în derulare lucrări.

În plus, Acordul de Mediu nr. 1/2015 - revizuire pentru scoaterea vegetației din circuitul forestier.

S-a lucrat, de asemenea, pe S1 și S3, astfel:

- ✓ S1 Brasov - Cata in st. Brasov (OCC Brasov), interval Bv-Stupini (SL fir II, LC fir II), st Stupini (LC III-IV, lucrari provizorii, terasamente Fir II, SL LIII-4,), interval Stupini - Bod terasamente Fir II), statia Feldioara (Pod km 193+093),
- ✓ S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (constructii civile), int. Cata -Archita (consolidari terasamente, poduri si viaducte, terasamente , podețe, drumuri, semnalizare), int Archita - Vanatori (poduri si viaducte, terasamente), statia Albesti (poduri si viaducte, constructii civile,), Albesti - Sighisoara (terasamente Fir II, podețe), Statia Sighisoara (CC)

❖ 2020

În 05.03.2020 a fost semnat contractul de lucrări și ERTMS iar în 16.04.2020 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor.

În 19.10.2020 a fost semnat contractul de consultanță iar în 27.10.2020 a fost dat ordinul de începere a serviciilor de consultanță.

❖ **SERVICII DE CONSULTANȚĂ în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului**

Contract semnat în 19.10.2020

Consultant: Asocieria S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. și S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoarea contractului de servicii: 35.510.106,40 lei fără TVA, conform act adițional

Sursa de finanțare: CEF 2014-2020

Ordin de începere: 27.10.2020

Stadiu: contract în derulare

❖ **SERVICII DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIILOR cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică**

Contract nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea 1. **Brașov - Apața**, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 4.387,09 mii lei fără TVA

Stadiu: contract de servicii în derulare

Contract nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica " Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea 3. **Cața-Sighișoara**, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303,71 mii lei fără TVA

Stadiu: contract de servicii în derulare

❖ **SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului**



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Contract semnat în 20.04.2021

Valoare contract: 166,50 mii lei fără TVA

Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.
