

Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2025

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea: **2. Apața - Cața**

Materiale de publicitate foto - video:

Youtube [aici](#)

FaceBook [aici](#)

Li nekdln [aici](#)

FINANȚARE PROIECT

Decizie de finanțare prin Program Transport 2021 - 2027

- ❖ Număr acțiune CEF: 2015-RO-TM-0362-W
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 455.278.642 euro, din care contribuția
FC (81,74%) - 372.144.762 euro
RO (18,26%) - 83.133.880 euro
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2016-31.12.2024,
- ❖ Ianuarie 2025 - prezent: : proiect finanțat din titlul aferent Programului Transport 2021-2027

IMPLEMENTARE PROIECT

❖ EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI IMPLEMENTARE ERTMS

Contract semnat în 22.09.2020

Valoare contract lucrări: 3.238.481.295,88 lei fără TVA conform actelor adiționale

Contractant: „Asocierea RailWorks”, dintre Aktor Technical Societe Anonyme (lider al asocierii), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A.

Durata de implementare: 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Ordin de începere lucrări: 03.11.2020

Stadiu: contract în derulare

❖ Stadiu, trimestrul IV 2025

Stadiu fizic lucrări: 58.75%

Stadiu financiar: 51.95%

❖ Stadiu, trimestrul III 2025

Stadiu fizic lucrări: 58.25%


Stadiu financiar: 43.82%

❖ Stadiu, trimestrul II 2025

Stadiu fizic lucrări: 58.08%


Stadiu financiar: 44.27%



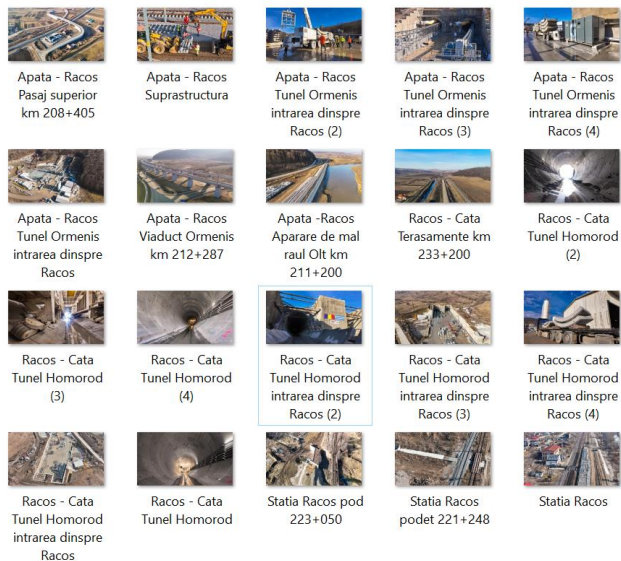

❖ **Stadiu, trimestrul I 2025**
Stadiu fizic lucrări: **50.50%**
Stadiu financiar: **43.27%**

❖ **Stadiu, trimestrul IV 2024**
Stadiu fizic lucrări: **43.77%**
Stadiu financiar: **35.71%**

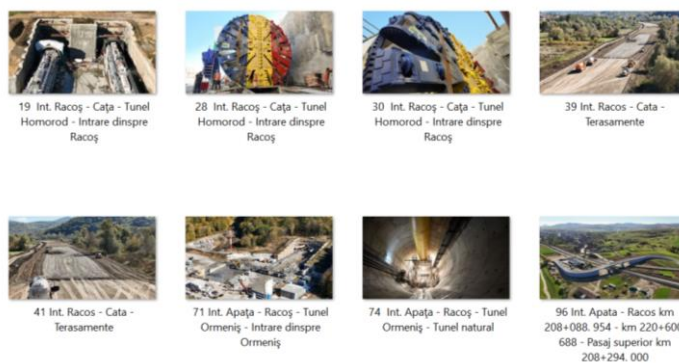

❖ **Stadiu, trimestrul III 2024**
Stadiu fizic lucrări: **36.60%**
Stadiu financiar: **33.51%**

❖ **Stadiu, trimestrul II 2024**
Stadiu fizic lucrări: **32.90%**
Stadiu financiar: **30.56%**





Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



02_Pasaj superior peste cf la Apata km 208+405



03_Pod km 223+203



03_Statia Racos km 221+000 - 223+200



04_Viaduct km 220+762



05_Portal P2 Tunel Ormenis km 220+100



05_Sprinjire cu coloane de beton km 220+219 ÷ km 220+346



05_Terasamente km 223+250 - 226+500



05_Viaduct km 212+287



05_Viaduct km 232+356



❖ Stadiu, trimestrul I 2024

Stadiu fizic lucrări: 21.70%

Stadiu financiar: 21.71%

❖ Stadiu, trimestrul IV 2023

Stadiu fizic lucrări: 19,85 %

Stadiu financiar: 18.69%



01_Aparare terasament la raul Olt km 210+946 - 211+320



01_Portal P2 Tunel Ormenis km 220+100



01_Portal P3 Tunel Homorod km 226+600



01_Viaduct km 212+287



02_Pod km 223+203



03_Statia Racos km 221+000 - 223+200



03_Viaduct km 220+762



03_Viaduct km 232+356



05_Portal P2 Tunel Ormenis km 220+100



06_Viaduct km 212+287



07_Aparare terasament la raul Olt km 210+946 - 211+320



07_Statia Racos km 221+000 - 223+200



07_Terasamente km 231+800 - 232+100



12_Viaduct km 220+762



13_Pasaj superior peste cf la Apata km 208+405



❖ Stadiu, trimestrul III 2023

Stadiu fizic lucrări: 17,50 %

Stadiu financiar: 17.38%



❖ Stadiu, trimestrul II 2023

Stadiu fizic lucrări: 16,5%

Stadiu financiar: 15,07%



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ **Stadiu, trimestrul I 2023**

Stadiu fizic lucrări:15,00%

Stadiu financiar: 12,04%

Stadiu, trimestrul IV 2022

Stadiu fizic lucrări:13,50%


Stadiu financiar: 12,04%



❖ **Stadiu, trimestrul III 2022:**

Stadiu fizic lucrări:11,00%

Stadiu financiar: 10,58%

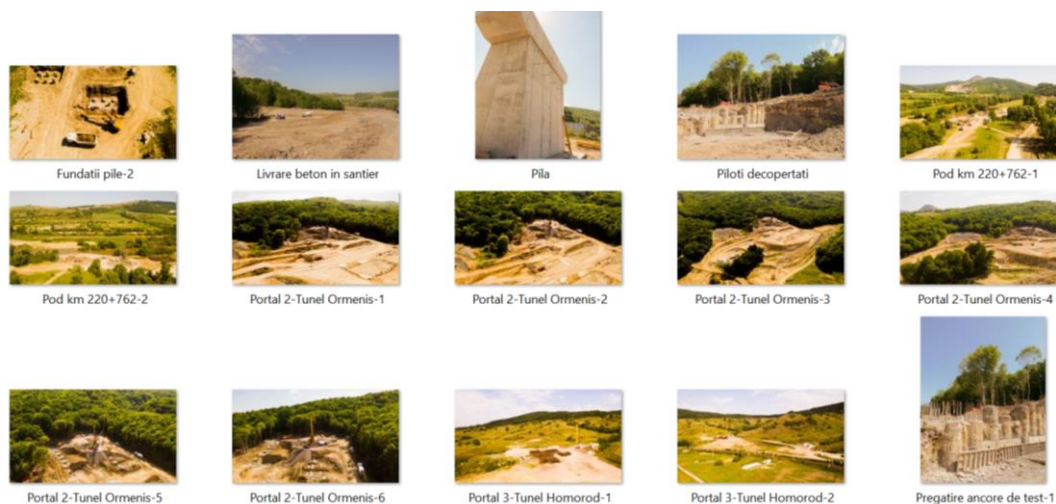



Co-finanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ Stadiu, trimestrul II 2022:

Stadiu fizic lucrări: 9.9%

Stadiu financiar: 10.18%

Exproprieri suplimentare, necesare finalizării proiectului;

Au fost aprobate instrucțiunile defrisare interval km 223+200 - 225+100 și Portal P2 Ormenis



040_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



041_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



042_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



043_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



044_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



045_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



046_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



047_executie piloti portal P3 -
tunel Homorod



050_statia Racos existenta



051_statia Racos existenta



052_statia Racos - lucrari pentru
cladirea noua



053_statia Racos - lucrari pentru
cladirea noua



054_statia Racos - utilaje ptr
lucrari la linie si instalatii cf



055_statia Racos - utilaje ptr
lucrari la linie si instalatii cf



056_statia Racos - utilaje ptr
lucrari la linie si instalatii cf

❖ Stadiu trimestrul I, 2022:

Stadiu fizic lucrări: 8.5 %

Stadiu financiar: 1,75%

17.03.2022 au fost emise facturile aferente CIP nr. 1.1, 1.2, 1.3 și au fost întreprinse toate demersurile în vederea plății

❖ 2021

Stadiu fizic: 6 %

Stadiu financiar: 0%

Contract de lucrări în derulare

Antreprenorul a transmis programul de șantier, documentația PTh și DDE, studiile geotehnice - în curs de realizare. S-a lucrat la organizarea de șantier din Rupea și s-au făcut lucrări de pichetare, trasare la portalurile 2 - tunel Ormeniș și 3 - tunel Homorod.

Acordul de mediu a fost în curs de revizuire, după scoaterea din circuitul forestier a suprafețelor împădurite, aferente zonelor expropriate. S-a lucrat la drumul de acces la portalul P1, km 212-213, la km 232, portalul P4, terasamente și podete între Apața și Ormeniș.

S-au realizat lucrări de terasamente și podete între Apața - Ormeniș

- amenajări la organizarea de șantier din zona Rupea
- lucrări de terasamente în zona Apața - Augustin
- lucrări pentru podete TIP C2, C3 și D4 pe zona Apața - Intrare Tunel Ormeniș P1
- demersuri pentru îndepărtarea vegetației forestiere din zona Tunel Ormeniș
- lucrări de reparații la Statia Racos (linia 2)
- lucrări la terasamente pe zona km 209+210 și în zona km 212+700



Contribuție de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene

❖ 2020



În 22.09.2020 s-a semnat contractul de lucrări iar în 03.11.2020 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor.

În 06.10.2020 a fost semnat contractul de consultanță, iar în 16.10.2020 a fost dat ordinul de începere a serviciilor de consultanță.

❖ **SERVICII DE CONSULTANȚĂ în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului**

Contract semnat în 06.10.2020

Valoare contract servicii: 27.011.725,96 lei, fără TVA lei fără TVA conform actelor aditionale

Consultant: Asocieria S.C. TPF INGINERIE S.R.L. (lider al Asocierii)- S.C. I.S.P.C.F. SA - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Ordin de începere servicii consultanță: 16.10.2020

Stadiu: contract de servicii în derulare

❖ **SERVICII DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIILOR cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică, subsecțiunea 2. Apața-Cața, aferente UAT: Apața, Racoș, Ormeniș, Homorod**

Contract semnat în 29.11.2018 "Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică «Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, Subsecțiunea 2. Apața - Cața» aferente UAT APAȚA, RACOȘ, ORMENIȘ, HOMOROD"

Valoare contract: 2.250.000 lei, fără TVA

Contractor: Asocieria S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter Proiect S.R.L.- S.C. Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.I. Gheorghe Simona Florina

Stadiu: contract de servicii în derulare.

❖ **SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului**

Contract semnat în 20.04.2021

Valoare contract: 166,5 mii lei fără TVA

Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.
